


A Concessionária comunica a conclusão da execução física do Marco II, com a modernização de 9.632 pontos de iluminação pública classificados como vias V1, V2 e V3, correspondentes a 100% (cem por cento) dos pontos abrangidos pelo referido Marco. A execução atende ao requisito quantitativo previsto nos itens 16.7.1, inciso I, e 16.7.5, inciso I do Caderno de Encargos para o Marco II, sem prejuízo das aferições e demais verificações previstas contratualmente para a emissão do respectivo Termo de Aceite.


Adicionalmente, foram instalados e disponibilizados 10.556 pontos com sistema de telegestão, quantitativo superior à meta contratual aplicável ao Marco II. A instalação acima do quantitativo mínimo foi realizada para assegurar margem operacional suficiente ao atingimento do Índice de Conectividade contratual, considerando a dinâmica de comunicação e disponibilidade dos dispositivos em campo.

A posição atualizada do sistema de gestão, registra avanço geral de modernização de 84,47%, correspondente a 38.825 pontos com tecnologia LED, em um universo de 45.963 pontos luminosos do cadastro.

*Figura 1 – Posição atualizada do avanço geral da modernização no sistema de gestão.*

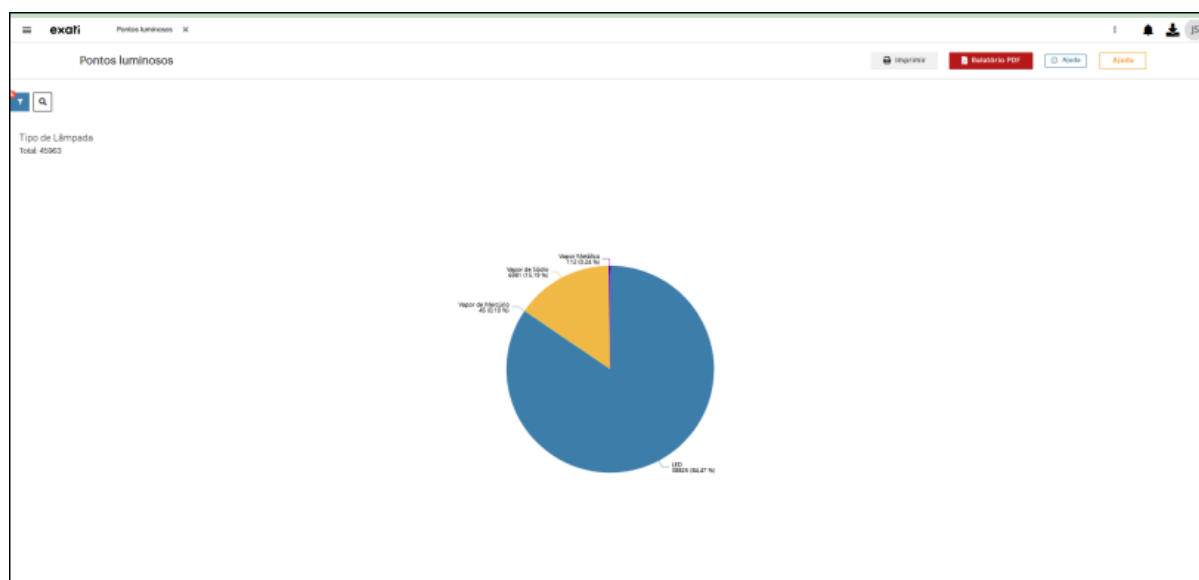

*Figura 2 – Distribuição dos 9.632 pontos executados nas vias V1, V2 e V3 para entrega do Marco II.*

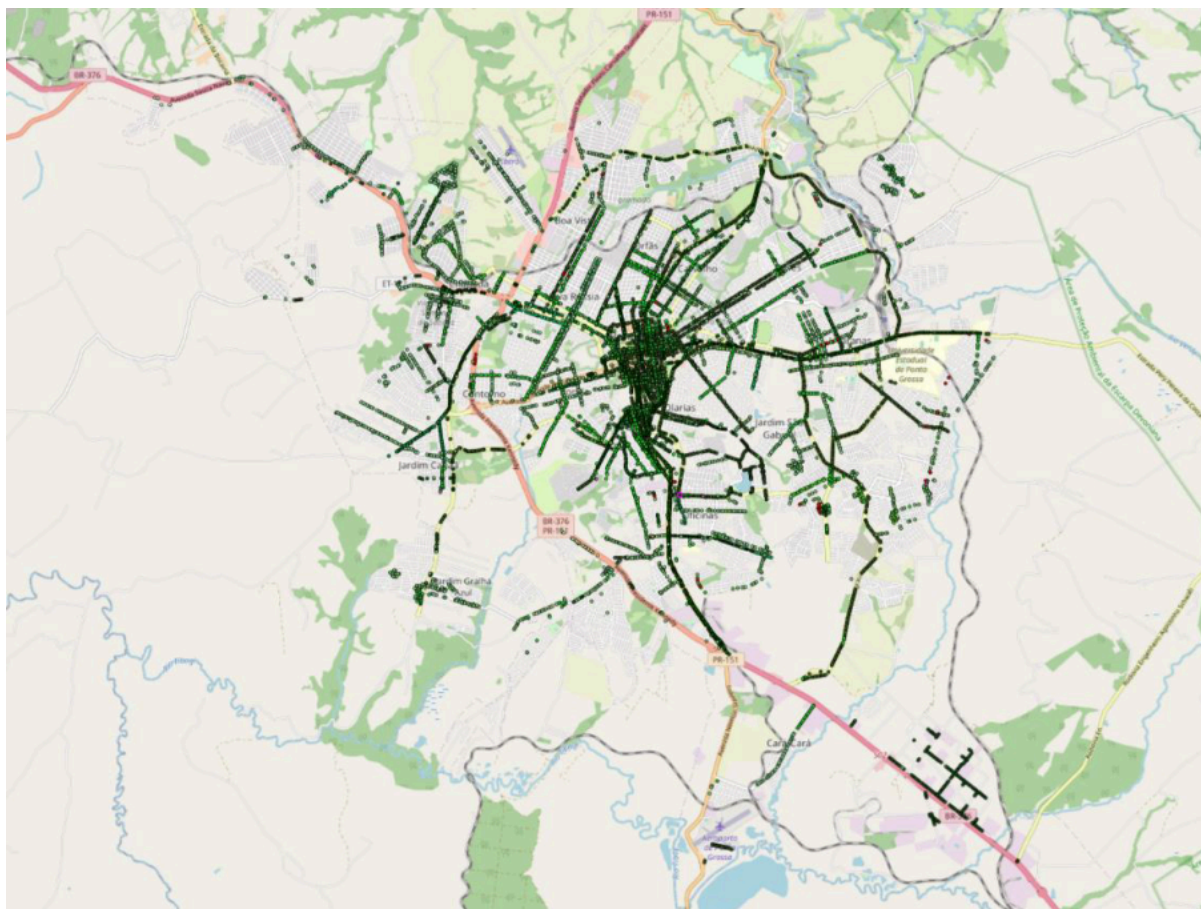

*Figura 3 – Distribuição dos 10.556 pontos com sistema de telegestão instalado.*

